สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว โดย นายชัยอนันต์ กรางชณีย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.อดุลย์รุ่งเรือง ๒๐๒๒ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๖๕๐๐๕๘๘๐ โดย นายอดุลย์ ใจชอบ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลง**รับงานปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้**

<u>ลักษณะโครงการ</u> **จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ ท่อ PVC ขนาด Ø ๔ นิ้ว ระยะทางยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร และท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกำหนด**

ณ บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	ภาคผนวก ๑ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๒	ผนวก ๒	ภาคผนวก ๒ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓	ใบเสนอราคา	จำนวน	๕	แผ่น
๒.๔	ผนวก ๔	แบบและรายละเอียดประกอบแบบ	จำนวน	๕	แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

/ข้อ ๓. หลักประกัน...

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **เงินสด ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๐๓๙๘/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๗๕๐.๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)** ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕(สิบห้า)วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง **จำนวนเงิน ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)** โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กราชชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - (-) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรวงชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

/ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลา...

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน**วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖** และจะต้องทำงาน**ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖** ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด **๒ (สอง) ปี** นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายอดุลย์ ใจชอบ)

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่งโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชัณย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

/ผู้รับจ้างจะต้อง...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและการที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

/ข้อ ๑๗. ค่าปรับ...

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **๒๙๕.๐๐ บาท (-สองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน-)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ **๒๕๐.๐๐ บาท (-สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การกำหนดค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

/ข้อ ๒๐... การทำ...

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายอดุลย์ ใจขอย)

/ในกรณีที่ผู้รับจ้าง...

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา(สูตรค่าK)จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดเงินค่างานหลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณสูตรดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายอดุลย์ ใจชอบ)

/ P = (Po) x (K)...

P = (Po) x (K)

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะดังนี้

หมวดงานระบบสาธารณูปโภค งานวางท่อ AC และ PVC ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ PVCt/PVCo

โดยมีดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

K = EXCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคา ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคา ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสรัลชนา บุราคร)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๕๔๑๘๔๑

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๙๒๒๐๒๗๓๗๔

พิมพ์

ตรวจ.....

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	66099541841
ชื่อโครงการ	จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	1509902410
ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303565005880
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์รุ่งเรือง 2022
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	20/2566
วันที่ทำสัญญา	26/09/2566 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	295,000.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	660922027374

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดูรายละเอียดสัญญา นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก

ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00398/66
วันที่ 26 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

ได้รับเงินจาก หจก.อดุลย์รุ่งเรือง 2022

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการ018.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินสด	2208010101.001	14,750.00	สัญญาเลขที่ 20092566 (CNTR-00339/66)
		รวมเงิน	14,750.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางธัญญ์นรี พันธ์วรารักษ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ผนวก 1

แผ่นที่ 1/1

ภาคผนวก 1

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1	ปูนซีเมนต์						
2	กระเบื้อง						
3	ผ้าเพดาน						
4	หลอดไฟ						
5	โคมไฟ						
รวม					XXX	XXX	XXX
อัตราร้อยละ					100	70	30

(ลงชื่อ).....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(.....)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชลีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....
ตรวจ.....

ผนวก 2

แผ่นที่ 1/1

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ประมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
1	เหล็กเส้น	ตัน			
2	เหล็กข้องอ	ตัน			
3	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
4					
5					
รวม			XXX	XXX	XXX
อัตรา ร้อยละ			100	70	30

(ลงชื่อ).....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(.....)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
เลขรับ 1098 / 2566
วันที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา ..... น.
☐สำนักงานปลัด ☐กองช่าง
☑กองกลาง ☐กองการศึกษา

ใบเสนอราคา

ผนวก 3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

1. ข้าพเจ้า หจก.อดุลย์รุ่งเรือง 2022 อยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดย นายอดุลย์ ใจชอบ ผู้มีอำนาจลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในขณะที่เสนอราคาครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาทำงานปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม **หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะทางยาว 780.00 เมตร และท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทางยาว 520.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกำหนด** ทั้งนี้ รูป แบบ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกำหนดให้ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบ รูป รายการและรายละเอียดแห่งการเสนอและตกลงราคาตามราคาดังที่ได้ระบุตามบัญชีรายการ ค่าแรงงาน และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงินทั้งสิ้น **295,000.00 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันเสนอราคาใบในเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานจ้างโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ของราคาที่เสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ใด ๆ อันเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....
ตรวจ.....

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยระเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นายอดุลย์ ใจชอบ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....
ตรวจ.....

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา

แบบ ปร.5

สรุปผลค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 3/5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคา หจก.อดุลย์รุ่งเรือง 2022 **โดย** นายอดุลย์ ใจชอบ

เสนอราคาในวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	223,700.339	1.3074	292,465.81	
2	ประเภทงานป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหักจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			295,465.81	
	ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			*295,000.00*	
	(-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ :

1. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายอดุลย์ ใจชอบ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 1/2

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคา หจก.อดุลย์รุ่งเรือง 2022 **โดย** นายอดุลย์ ใจชอบ **เสนอราคาในวันที่** 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	<u>ประเภทงานอาคาร</u>								
1	งานขุดดินแล้วถมคืน	260	ลูกบาศก์เมตร	-	-	125.00	32,500.00	32,500.00	
2	งานเดินท่อและประสานท่อ PVC	1,300	เมตร						
	2.1 ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	195	ท่อน	510.28	99,504.60	189.00	36,855.00	136,359.60	
	2.2 ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	130	ท่อน	151.40	19,682.00	56.00	7,280.00	26,962.00	
	2.3 ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด ½ นิ้ว	15	ท่อน	40.19	602.85	14.00	210.00	812.85	
	2.4 แคลมป์รัดแยก PVC ขนาด 4 นิ้ว x ½ นิ้ว	30	อัน	231.00	6,930.00	70.00	2,100.00	9,030.00	
	2.5 แคลมป์รัดแยก PVC ขนาด 2 นิ้ว x ½ นิ้ว	23	อัน	89.00	2,047.00	27.00	621.00	2,668.00	
	2.6 แคลมป์รัดแยก PVC ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว	7	อัน	237.00	1,659.00	70.00	490.00	2,149.00	
	2.7 ข้อต่อ PVC งอ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	8	อัน	135.51	1,084.08	50.00	400.00	1,484.08	
	2.8 วาวล์ เปิด-ปิด PVC งอ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	2	อัน	1,264.00	2,528.00	380.00	760.00	3,288.00	
	2.9 วาวล์ เปิด-ปิด PVC งอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	2	อัน	208.00	416.00	62.00	124.00	540.00	
	2.10 น้ำยาประสานท่อ PVC	60	กระป๋อง	131.78	7,906.80	-	-	7,906.30	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	223,700.33	
							ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Factor F) ประเภทงานอาคาร	1.3074	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น	292,465.81	

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....
ตรวจ.....

แบบ ปร.4 2/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
3	งานป้ายโครงการ								
	13.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	13.2 ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	295,465.81	
							(-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) *ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน*	*295,000.00*	

หมายเหตุ : 1. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายอดุลย์ ใจชอบ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ผนวก 4

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

แบบแปลนงานก่อสร้าง

แบบแปลนโครงการ

ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้ว

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวกาตุ้มณี เนื้อดี) (นางสาวเพชราภรณ์ ยาวยืน)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

แบบแปลนงานก่อสร้าง

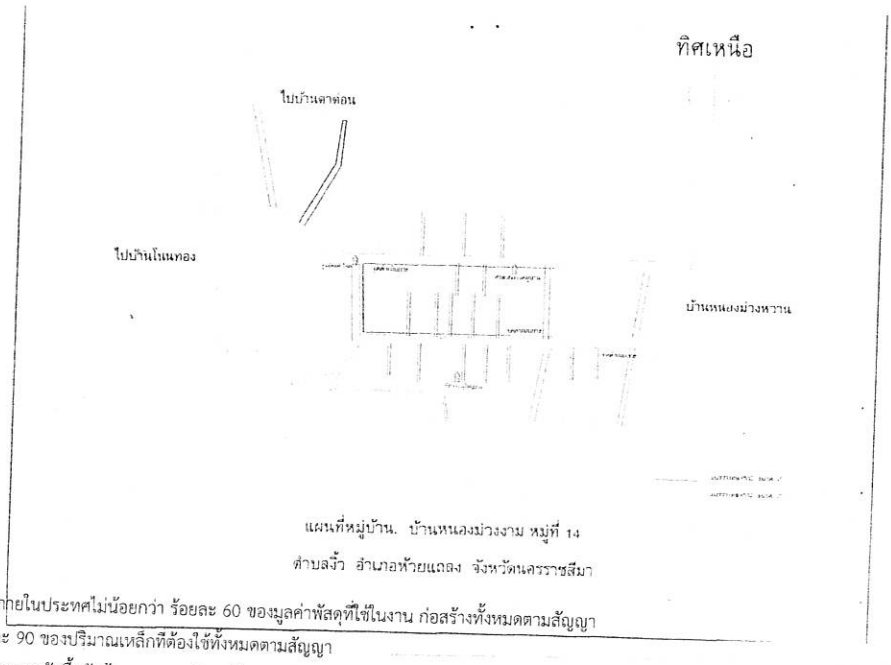

แผนที่หมู่บ้าน. บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสรัลชนา บุราคร)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวเพชราภรณ์ ยาวยืน)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

แบบแปลนงานก่อสร้าง



1.แบบการวางท่อทั่วไป 2.แบบการต่อข้อลด PVC



3.แบบการต่อข้อลด PVC 4.แบบการต่อสามทาง PVC

อบต.งิ้ว

โครงการ

ออกแบบ

เขียน

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบ

มาตราส่วน

เลขที่แบบ แสน

หมายเหตุ 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี) (นางสาวเพชราภรณ์ ยาวยืน)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์

ตรวจ

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง

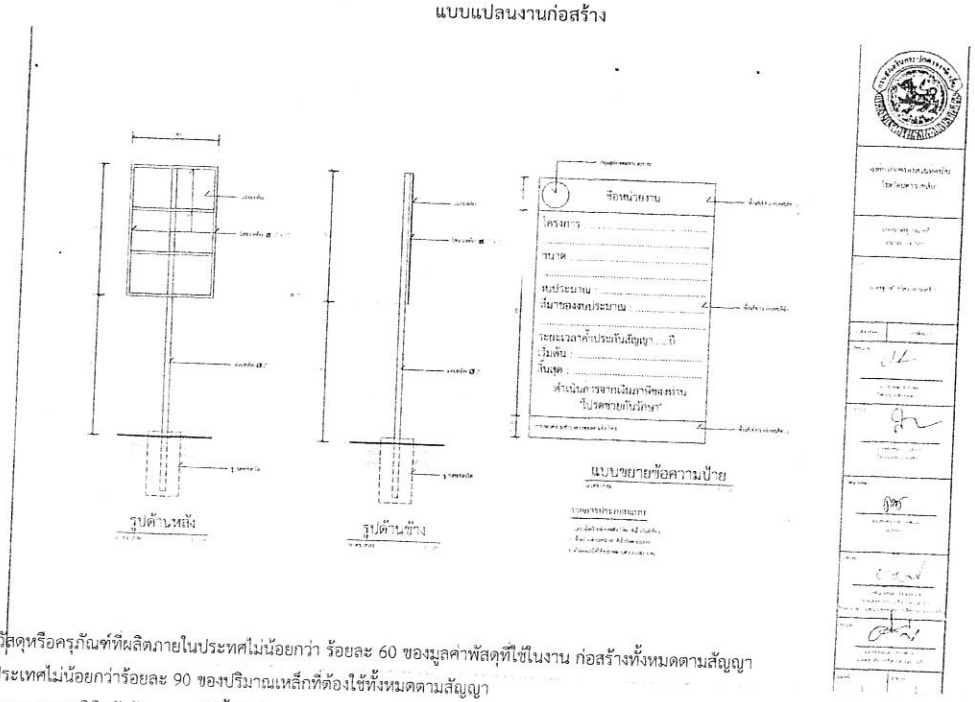

<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี) (นางสาวเพ็ราภรณ์ ยาวยืน)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง

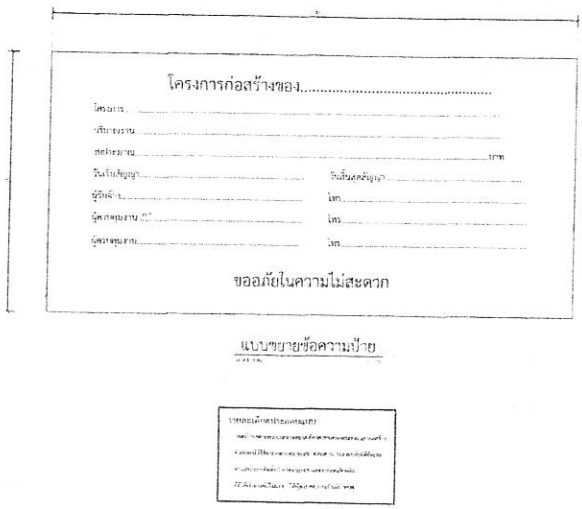

<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี) (นางสาวเพชราภรณ์ ยาวชื่น)

เอกสารแนบท้ายการจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอดุลย์ ใจชอบ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....
